
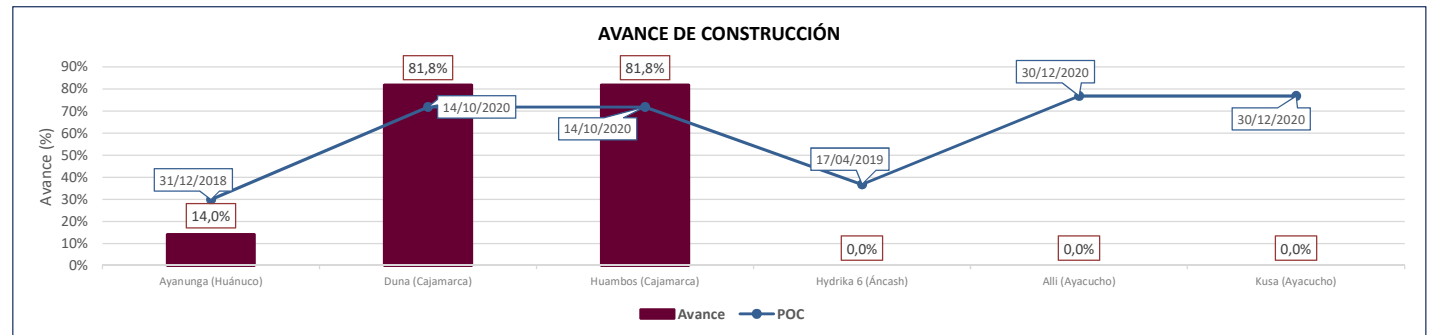


CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (Cuarta Subasta)

| Ítem | Firma de Contrato | Tipo | Proyecto | Adjudicatario | Energía Anual Adjudicada (MWh) | Potencia Instalada (MW) | Monto de Inversión (Mio U\$S) | Preci Ofertado (Ctvs. U\$S/ kW.h) | POC Contrato | POC Vigente | Avance | Estado |
|--------------|-------------------|------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------|---|
| 1 | 17.05.2016 | C.H. | Ayanunga (Huánuco) | Energética Monzón | 131 651 | 20,0 | 48,3 | 4,398 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14,0% | Las actividades de la obra se encuentran paralizadas desde el mes de agosto del 2018. Durante el periodo de Emergencia Nacional no hay actividades en la ejecución de la obra. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. |
| 2 | 17.05.2016 | C.E. | Duna (Cajamarca) | GR Taruca S.A.C. | 81 000 | 18,0 | 25,9 | 5,179 | 31.12.2018 | 14.10.2020 | 81,8% | El 30.05.2020, se aprobó el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. Las obras en el proyecto se suspendieron por el Estado de Emergencia Nacional, entre el 16.03.2020 y 01.06.2020, y se reiniciaron según información proporcionada por la Concesionaria mediante Carta N° RG-136-2020, el 02.06.2020. Se dio inicio el izado de estructuras de los aerogeneradores. |
| 3 | 17.05.2016 | C.E. | Huambos (Cajamarca) | GR Paino S.A.C. | 84 600 | 18,0 | 25,9 | 4,679 | 31.12.2018 | 14.10.2020 | 81,8% | El 30.05.2020, se aprobó el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. Las obras en el proyecto se suspendieron por el Estado de Emergencia Nacional, entre el 16.03.2020 y 01.06.2020, y se reiniciaron según información proporcionada por la Concesionaria mediante Carta N° RG-136-2020, el 02.06.2020. Se dio inicio el izado de estructuras de los aerogeneradores. |
| 4 | 17.05.2016 | C.H. | Hydrika 6 (Áncash) | Hydrika 6 S.A.C. | 60 000 | 8,9 | 21,0 | 4,590 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 0,0% | Osinerghmin el 29 de junio y el 15 de julio del presente año sostuvo reuniones remotas con el Estudio Arnold & Porter que viene defendiendo al Estado en el arbitraje que se lleva a cabo ante el CIADI. El MINEM solicitó al CIADI prórroga hasta el 19.08.2020 para responder, por el problema del COVID-19. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado. |
| 5 | 17.05.2016 | C.H. | Alli (Ayacucho) | Concesionaria Hidroeléctrica Sur Medio S.A. | 69 324 | 14,5 | 28,5 | 4,540 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 0,0% | La Concesionaria presentó el expediente para la obtención de la Concesión Definitiva, el MINEM les informó que está en trámite la opinión del Ministerio de Cultura. La Concesionaria, referente al arbitraje informó que se designó al presidente del tribunal quien ya aceptó el encargo. El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. |
| 6 | 17.05.2016 | C.H. | Kusa (Ayacucho) | Concesionaria Hidroeléctrica Sur Medio S.A. | 72 528 | 15,6 | 29,3 | 4,540 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 0,0% | La Concesionaria presentó el expediente para la obtención de la Concesión Definitiva, el MINEM les informó que está en trámite la opinión del Ministerio de Cultura. La Concesionaria, referente al arbitraje informó que se designó al presidente del tribunal quien ya aceptó el encargo. El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. |
| TOTAL | | | | | 499 103 | 95,0 | 178,8 | | | | | |

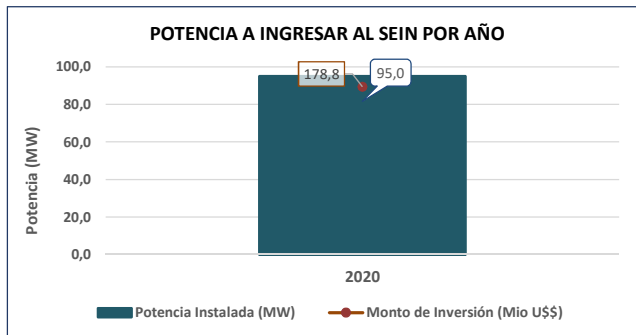

Donde:

C.H. : Central Hidroeléctrica

C.E. : Central Eólica
