



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO TUMBES - JUNIO DE 2022



EMPRESA TITULAR: GAS NATURAL DE TUMBES S.A.C.

PERFIL DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en brindar el servicio de distribución de gas natural por red de ductos en el área de concesión, que comprende el departamento de Tumbes:

- Corrales
- La Cruz
- Zarumilla
- Tumbes

INFRAESTRUCTURA:

Transporte terrestre de Gas Natural Comprimado (GNC) - Primera Etapa: Abastecimiento desde Paita en la modalidad GNC, transporte por carretera hasta cada City Gate. Desde las City Gates se distribuye a cada zona geográfica de su influencia.

Estaciones de Distrito - Incluyen un sistema de recepción, almacenamiento y descompresión de GNC, además de las estaciones de regulación, medición y odorización.


Sistema de Distribución de Gas Natural - Por red de ductos, para suministrar a los usuarios finales.

Sistema de Gasoducto - Segunda Etapa: se construye una troncal que conecta los City Gates.

DATOS DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE FIRMA (CIERRE)	POC	PLAZO DE LA CONCESIÓN	COMPROMISO DE INVERSIÓN	OPERADOR CALIFICADO
30 abril 2019	21 mayo 2019	15 octubre 2021	20 años desde la POC	USD 11,42 MM	Especialista en Gas del Perú SAC

Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes

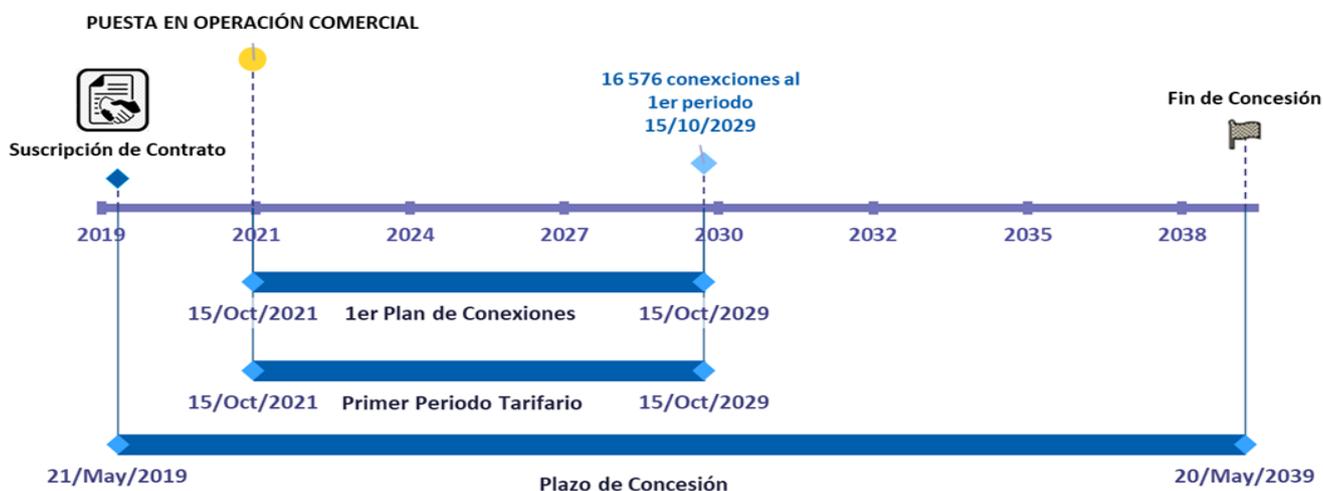


SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO TUMBES - JUNIO DE 2022

HITOS DEL PROYECTO



CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

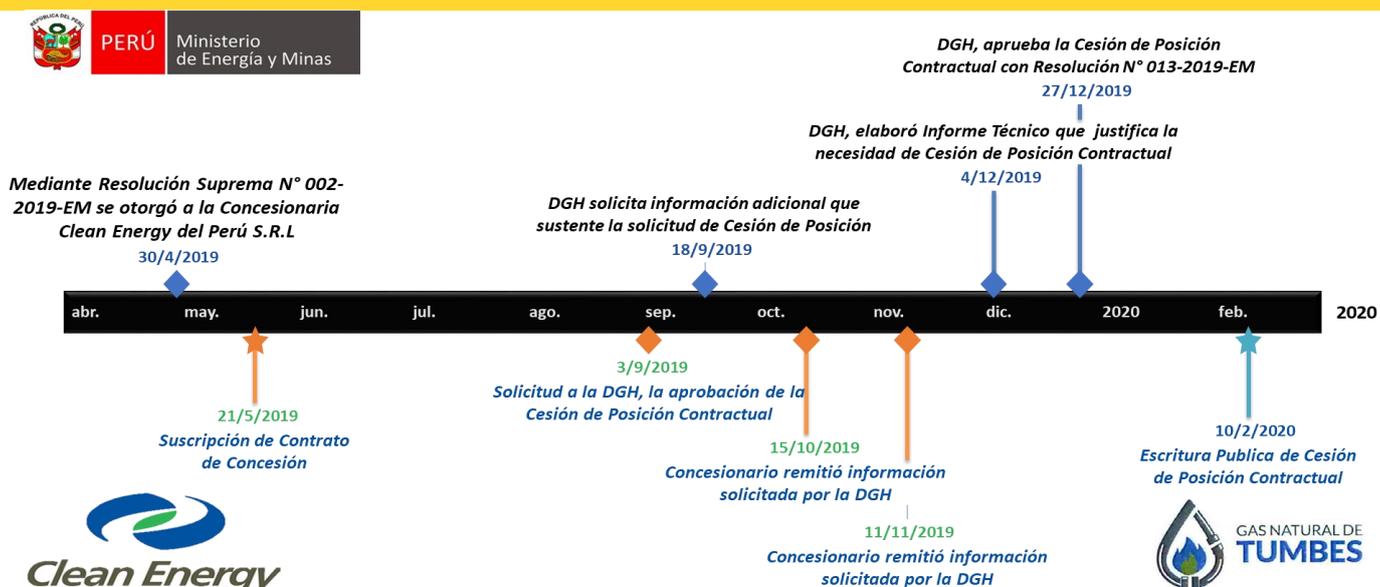

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA

ITEM	HITOS PRINCIPALES	FECHA SEGÚN CRONOGRAMA	FECHA CONTRACTUAL**	FECHA DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DEL HITO	OBSERVACIONES
1	Adjudicación de la Concesión	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Sí	adjudicación
2	Suscripción de Contrato de Concesión	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	Sí	Suscripción de Contrato
3	Entrega de Garantía #1	-	5/08/2019	5/08/2019	Sí	Desde la Suscripción del Contrato hasta 60 días posteriores a la POC
4	Cronograma Inicial de Obras Mes 6	-	20/11/2019	20/11/2019	Sí	Cronograma de actividades para la POC
5	Entrega de Estudio de Disponibilidad	16/08/2019	20/11/2019	20/11/2019	Sí	Estudio de disponibilidad
6	Cronograma Actualizado Mes 12	-	20/05/2020	04/06/2020	Sj*	Cronograma a los 12 meses
7	Cronograma Actualizado Mes 18	-	20/11/2020	20/11/2020	Si	Cronograma a los 18 meses


SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO TUMBES - JUNIO DE 2022

ITEM	HITOS PRINCIPALES	FECHA SEGÚN CRONOGRAMA	FECHA CONTRACTUAL**	FECHA DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN DEL HITO	OBSERVACIONES
8	Aviso de Construcción Sistema de Distribución	-	08/06/2021	08/06/2021	Si	60 días Antes del Inicio de Construcción.
9	Cronograma Anualizado - Plan De Conexiones (Comercial)	-	16/08/2021	26/08/2021	Si	60 días Antes de la POC
10	Entrega De Garantía #2	-	15/09/2021		Pendiente	30 días Antes de la POC
11	Inicio de Construcción	07/08/2021	17/09/21		Pendiente	Inicio de Construcción.
12	Puesta en Operación Comercial - POC	15/10/2021	15/10/2021		Pendiente	POC (16.576)


*Se presento el Cronograma al concedente fuera del plazo establecido.

** Mediante Carta N° GNT-PRO -072-2021, notificado el 06 de agosto de 2021, se presento el Cronograma y Plazos de ejecución actualizado.

HITOS EN RELACIÓN A GFC Y LA POC

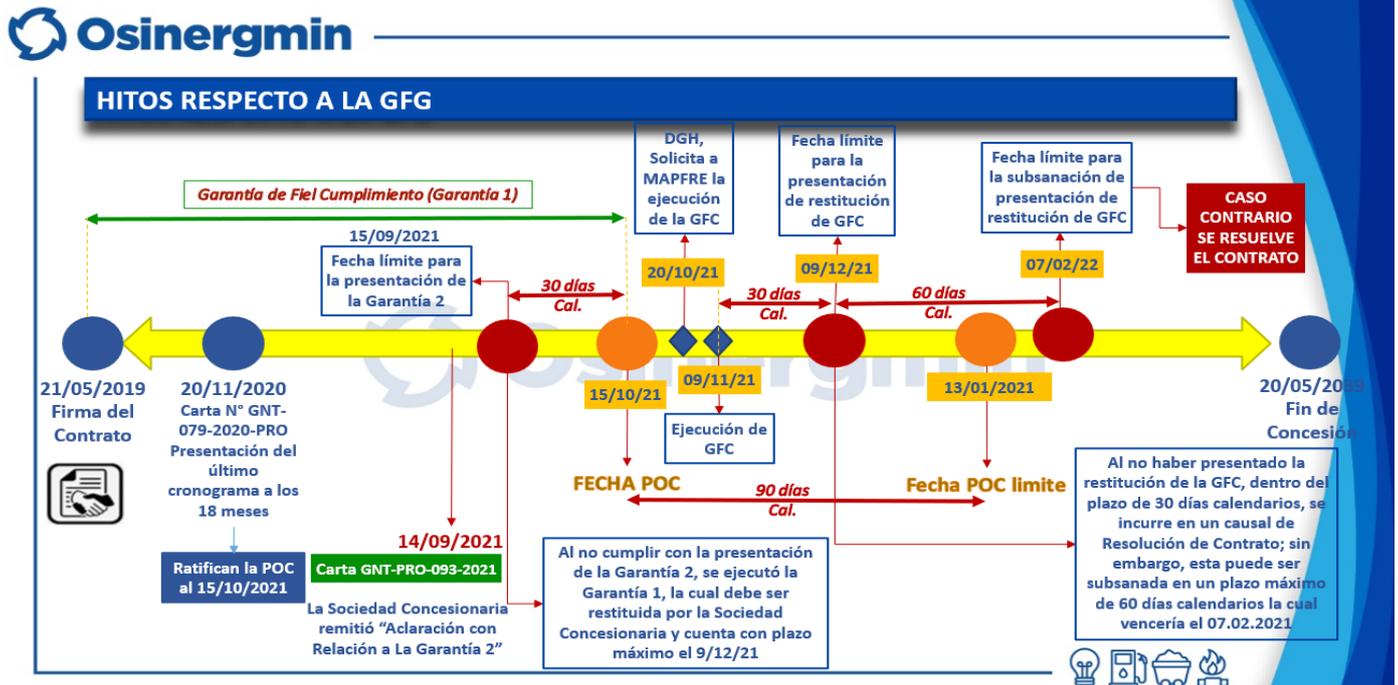

HITOS EN RELACIÓN A LA POC, RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y TRATO DIRECTO

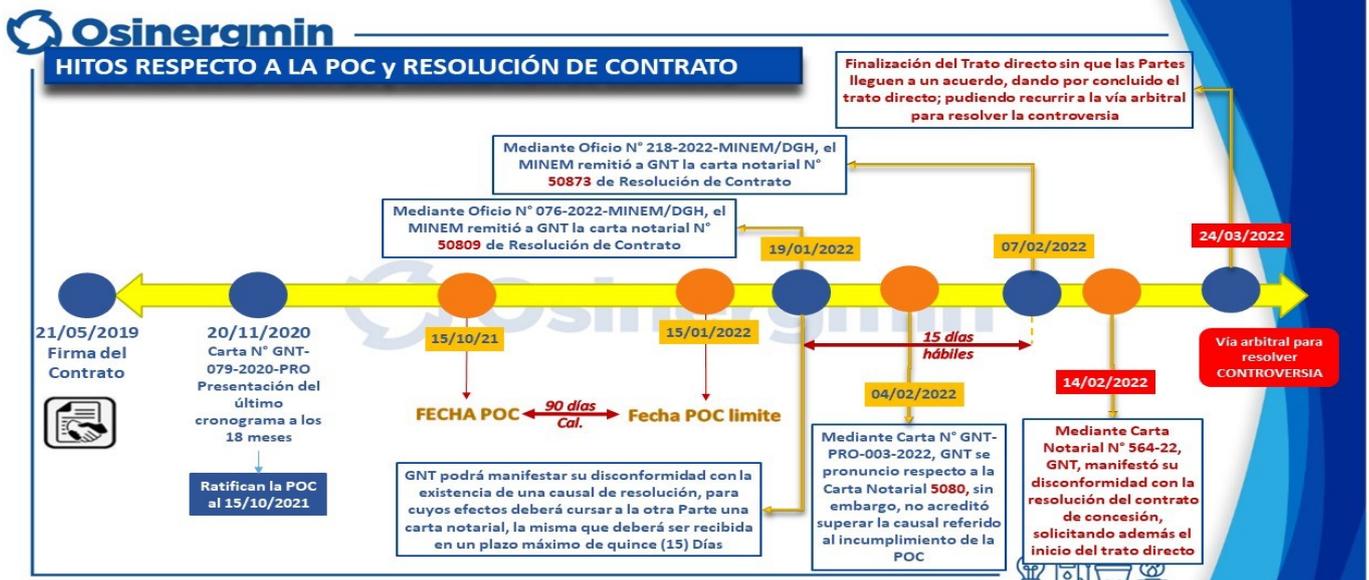

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO TUMBES - JUNIO DE 2022

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

OBLIGACIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	
Garantía de Fiel Cumplimiento (Garantía 1)	✓	05.08.2019: Remite la copia de la garantía de fiel cumplimiento.
Obligaciones relacionadas al Operador Calificado	✓	05.08.2019: la Concesionaria remitió copia de su Estatuto, en el cual se verifican las acciones con las que cuenta su Operador Calificado
	✓	04.09.2019: La Concesionaria presentó copia del Contrato de Fideicomiso.
Cronograma y Plazos de Ejecución de la Construcción	✓	20.11.2019: Concesionaria remitió el cronograma inicial de obras de la Concesión.
Estudio de Disponibilidad	✓	20.11.2019: Concesionaria remitió el Estudio de Disponibilidad de la Concesión.
Cesión de Posición Contractual	✓	10.02.2020: Concesionaria celebró Contrato de Cesión de Posición Contractual con la nueva concesionaria Gas Natural Tumbes S.A.C.
Cronograma y Plazos de Ejecución de la Construcción	✓	20.11.2020: Concesionaria presentó la actualización del Cronograma y Plazos de Ejecución correspondiente a la versión actualizada a los dieciocho (18) meses de Suscripción del Contrato
Cronograma y Plazos de Ejecución de la Construcción	✓	03.02.2021: Concesionaria presentó la 1era Reprogramación del Cronograma y Plazos de Ejecución.
Estados Financieros Trimestrales	✓	04.02.2021: Concesionaria remitió los Estados Financieros Trimestrales correspondiente al IV Trimestre 2020.
Estudio de Riesgos conforme a la Cláusula 12 del Contrato.	✓	15.03.2021: Presentación del Estudio de Riesgos conforme a la Cláusula 12 del Contrato.
Manual de Construcción	✓	15.03.2021: Presentación del Manual de Construcción
Renovación Garantía de Fiel Cumplimiento (Garantía 1)	✓	17.03.2021: Concesionaria presentó a la DGH, la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
Informe de Avance Mensual	✓	22.04.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de marzo de 2021.
Estados Financieros Auditados	✓	29.04.2021: Concesionaria presentó los Estados Financieros Auditados correspondiente al ejercicio 2020.
Estados Financieros Trimestrales	✓	29.04.2021: Concesionaria remitió los Estados Financieros Trimestrales correspondiente al I Trimestre 2021.
Propuesta de Inspectores	✓	03.06.2021: Concesionaria presentó a la DGH la propuesta de Inspectores
Comunicación de Inicio de Construcción	✓	07.06.2021: Concesionaria presentó a la DGH la Comunicación de Inicio de Construcción.
Programa de Gestión de Calidad	✓	14.06.2021: Concesionaria presentó el Programa de Gestión de Calidad.
Informe de Avance Mensual	✓	16.06.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de mayo de 2021.
Informe de Avance Mensual	✓	20.07.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de junio de 2021.
Estados Financieros Trimestrales	✓	27.07.2021: Concesionaria remitió los Estados Financieros Trimestrales correspondiente al II Trimestre 2021.
Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual	✓	12.08.2021: Concesionaria presentó la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
Informe de Avance Mensual	✓	19.08.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de julio de 2021.
Cronograma del Primer Plan de Conexiones	✓	26.08.2021: Concesionaria presentó el Cronograma detallado por periodos anuales del Primer Plan de Conexiones.
Suspensión de Plazos del Contrato	✓	10.09.2021: Concesionaria presentó a la DGH, la Solicitud de Suspensión de Plazos del Contrato.
Pólizas de Seguro Civil Contractual y Extracontractual	✓	14.09.2021: Concesionaria presentó, la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual (30.08.21 al 30.09.21).
Informe de Avance Mensual	✓	23.09.2021: Concesionaria presentó el Informe de Avance Mensual en referencia a la RCD N° CD-166-2020-OS/CD. Correspondiente al mes de agosto de 2021.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO TUMBES - JUNIO DE 2022

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO

- Mediante Carta S/N de fecha 05 de agosto de 2019, la Concesionaria remitió copia de su Estatuto, en el cual se verifican las acciones con las que cuenta su Operador Calificado, Especialistas en Gas del Perú S.A.C.
- Mediante Carta S/N de fecha 20 de noviembre de 2019, la Concesionaria remitió el Cronograma inicial de obras y el Estudio de Disponibilidad de la Concesión.
- Mediante Resolución N° 013-2019-EM de fecha 27 de diciembre del 2019, la DGH, aprueba la Cesión de Posición Contractual del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes.
- Mediante Cesión de Posición Contractual de fecha 10 de febrero del 2020, del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes se establece como Nueva Sociedad Concesionaria a Gas Natural Tumbes S.A.C.
- Mediante la Carta Fianza N° 7101910100566-001, presentada a la DGH el 12 de junio de 2020, la Concesionaria remitió la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
- el Cronograma y Plazos de Ejecución correspondiente a la versión actualizada a los dieciocho (18) meses de Suscripción del Contrato.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-016-2021, presentada a Osinergmin el 15 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los el Estudio de Riesgos.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-019-2021, presentada a Osinergmin el 15 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el Manual de Construcción.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-020-2021, presentada a la DGH el 17 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento la Renovación de Garantía de Fiel Cumplimiento.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-037-2021, presentada el 28 de abril de 2021, la Sociedad Concesionaria presento un Informe Técnico N° 1 "Avance de Red de Distribución de Gas Natural Tumbes" a solicitud de la DGH.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-038-2021, presentada el 29 de abril de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los Estados Financieros Trimestrales correspondiente al I trimestre 2021.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-046-2021, presentada el 17 de mayo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el Informe de Avance Mensual correspondiente a abril 2021.
- Mediante Carta S/N de fecha 05 de agosto de 2019, la Concesionaria remitió copia de su Estatuto, en el cual se verifican las acciones con las que cuenta su Operador Calificado, Especialistas en Gas del Perú S.A.C.
- Mediante Carta S/N de fecha 20 de noviembre de 2019, la Concesionaria remitió el Cronograma inicial de obras y el Estudio de Disponibilidad de la Concesión.
- Mediante Resolución N° 013-2019-EM de fecha 27 de diciembre del 2019, la DGH, aprueba la Cesión de Posición Contractual del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes.
- Mediante Cesión de Posición Contractual de fecha 10 de febrero del 2020, del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes se establece como Nueva Sociedad Concesionaria a Gas Natural Tumbes S.A.C.
- el Cronograma y Plazos de Ejecución correspondiente a la versión actualizada a los dieciocho (18) meses de Suscripción del Contrato.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-016-2021, presentada a Osinergmin el 15 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los el Estudio de Riesgos.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-019-2021, presentada a Osinergmin el 15 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los el Manual de Construcción.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-020-2021, presentada a la DGH el 17 de marzo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento la Renovación de Garantía de Fiel Cumplimiento.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-038-2021, presentada el 29 de abril de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los Estados Financieros Trimestrales correspondiente al I trimestre 2021.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-045-2021, presentada el 14 de mayo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el título de inscripción de la modificación parcial de estatuto de Gas Natural de Tumbes en la que se consigna el derecho del operador calificado.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-046-2021, presentada el 17 de mayo de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el Informe de Avance Mensual correspondiente a abril 2021.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-049-2021, notificada a la DGH el 03 de junio de 2021, la Concesionaria Presentó la Propuesta de Inspectores.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-051-2021, notificada a la DGH el 07 de junio de 2021, Gas Natural de Tumbes presento la Comunicación del Inicio de Construcción.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-056-2021, notificada a Osinergmin el 14 de junio de 2021, Gas Natural Tumbes, remitió, el Programa de Gestión de Calidad, a través de la Ventanilla Virtual.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-057-2021, presentada el 20 de julio de 2021, la Sociedad Concesionaria presento el Informe de Avance Mensual correspondiente a junio 2021.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-066-2021, presentada el 27 de julio de 2021, la Sociedad Concesionaria presento los Estados Financieros Trimestrales correspondiente al II trimestre 2021 .
- Mediante carta GNT-PRO-075-2021 del 12 de agosto de 2021, se remitió a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NRO. 1201 - 528327 y el anexo de cobertura provisional del 02 de agosto de 2021.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-077-2021 de fecha 19 de agosto de 2021 Gas Natural Tumbes, presento el Informe de Avance N° 06, correspondiente al periodo julio de 2021, a través del SISUPP.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-082-2021 de fecha 26 de agosto de 2021 Gas Natural Tumbes, presento a la DGH, el Cronograma detallado


SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO TUMBES - JUNIO DE 2022

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO

- Mediante Carta N° GNT-PRO-092-2021, notificada a la DGH, el 10 de setiembre de 2021, Gas Natural Tumbes, remitió, la Solicitud dejar sin efecto la designación de la empresa TÜV RHEINLAND PERÚ S.A.C. y remitió la lista de empresas de prestigio internacional para la elección del cargo del nuevo INSPECTOR.
- Mediante carta N° GNT-PRO-094-2021, del 14 de setiembre de 2021, la Sociedad Concesionaria remitió a Osinergmin el anexo de cobertura provisional, el cual tiene plazo de vigencia desde el 30/08/2021 hasta el 30/09/2021, precisando en dicha comunicación que la referida cobertura se renueva mensualmente.
- Mediante Carta N° GNT-PRO-099-2021 de fecha 23 de setiembre de 2021 Gas Natural Tumbes, presento el Informe de Avance N° 07, correspondiente al periodo agosto de 2021, a través del SISUPP.
- Mediante Oficio N° 382-2021-MINEM-SG/OGA, de fecha 20 de octubre de 2021, la DGH remitió a MAPFRE Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros el documento de Asunto "Ejecución de Carta Fianza N° 7101910100566-002"
- Mediante Carta N° GNT-PRO-0104-2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, la Sociedad Concesionaria remitió a DGH el documento de Asunto "Solicitud de prórroga para la presentación de la Garantía 2 -Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Tumbes"
- Mediante Carta N° GNT-PRO-001-2022 la Sociedad Concesionaria presentó a la DGH, el documento de Asunto "Solicitud de Suspensión de Plazos del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por red de Ductos en el Departamento de Tumbes, por Acuerdo entre las Partes.
- Mediante OFICIO N° 026-2022-MINEM/DGH de fecha 10 de enero de 2022, la DGH remitió la respuesta a la Solicitud presentada por GNT, en la cual solicita que GNT remita un informe técnico sustentatorio para la Solicitud de Suspensión de Plazos de Contrato.
- Mediante Oficio N° 076-2022-MINEM/DGH, de fecha 18 de enero de 2022, la DGH envió a Gas Natural Tumbes el documento de asunto "Puesta en Operación Comercial del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Tumbes", la cual cuenta con Certificación Notarial con fecha 20 de enero de 2022, dando inicio a la Resolución del contrato de Concesión debido a que no se realizó la POC el 15 de enero de 2022, fecha máxima establecida para el cumplimiento de la POC.
- Mediante Oficio N° 218-2022-MINEM/DGH, de fecha 07 de febrero de 2022, la DGH envió a Gas Natural Tumbes el documento de asunto "Resolución de Contrato por incumplimiento grave del Concesionario", la cual cuenta con Certificación Notarial N° 50873 con fecha 07 de febrero de 2022.
- Mediante Carta N° S/N (Carta Notarial N° 564-22), notificada a la DGH el 14 de febrero de 2022, Gas Natural Tumbes manifestó su disconformidad con la resolución del contrato de concesión, solicitando además el inicio del trato directo contemplado en la cláusula 15 del Contrato de Concesión.
- El trato directo entre GNT y el Ministerio, el cual se realizó en dos (02) sesiones y finalizó el **24 de marzo de 2022**, con la suscripción del acta de segunda reunión de trato directo, sin que las Partes lleguen a un acuerdo, dando por concluido el trato directo; acordando además en dicha acta que, las Partes se encuentran habilitadas para recurrir a la vía arbitral para resolver la controversia.

REGISTROS ESTADÍSTICOS

Primer Plan de Conexiones Concesión Tumbes

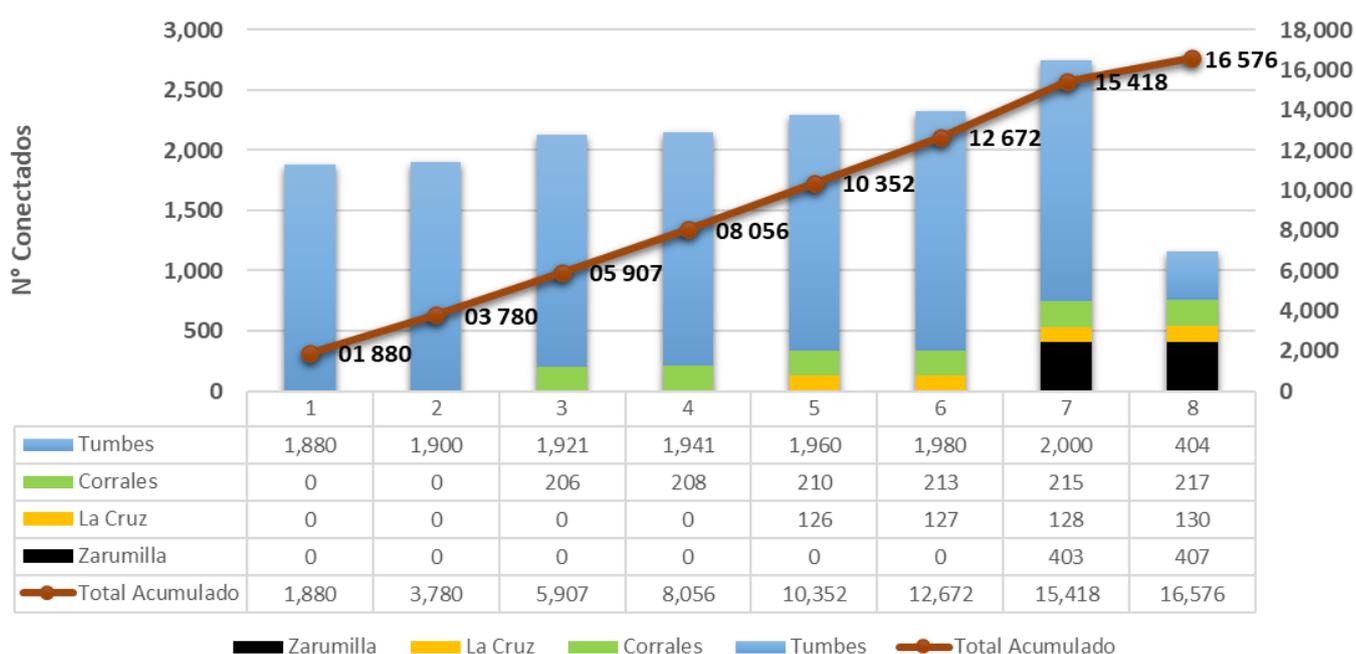

El Concesionario se comprometió a conectar a **16 576 clientes** residenciales en un plazo de ocho (8) años, de acuerdo con el Primer Plan de Conexiones, que se encuentra contenido en el Anexo N° 05 del Contrato de Concesión.
