
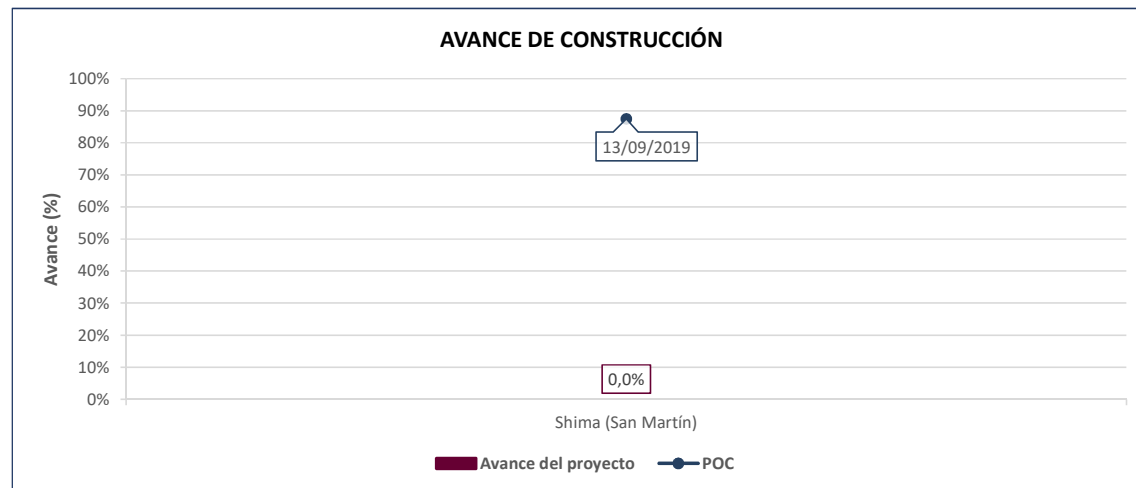


**CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES
(EN CONSTRUCCIÓN - Primera Subasta)**

Ítem	Firma de Contrato	Tipo	Proyecto	Empresa Concesionaria	Energía Anual Ofertada (MW.h)	Potencia de Contrato (MW)	Monto de Inversión (Mio US\$)	Precio Ofertado (Ctvs. US\$/kW.h)	Avance del proyecto	POC Contrato	POC Vigente	Estado
1	31.03.2010	C.H.	Shima (San Martín)	Energía Hidro S.A.C.	32 922	5,0	20,9	6,400	0,0%	30.09.2012	13.09.2019	Aún no se ha iniciado las obras del proyecto. No se han cumplido con los hitos Cierre Financiero; Inicio de Obras Civiles; Llegada de Equipamiento a sitio, Inicio de Montaje ni Puesta en operación Comercial. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
TOTAL					32 922	5,0	20,9					

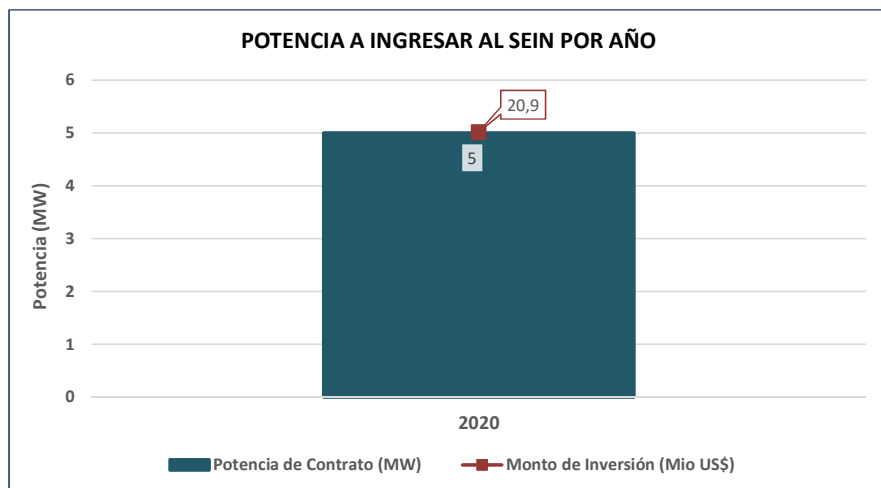

C.H. : Central Hidroeléctrica
