


CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAMPANAYOCC (4,62 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA		MPJ CONSULTING S.A.C.	
DESCRIPCIÓN			
La Central Hidroeléctrica Campanayoc está ubicada en el distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga departamento de Ayacucho.			
UBICACIÓN			
Departamento	Ayacucho	Provincia	Huamanga
Distrito	Carmen Alto	Altitud	2 800 msnm
DATOS DE LA CENTRAL			
Potencia Instalada	4,62 MW	Tipo de Central	De pasada
Salto Neto – Salto Bruto	530 m / 546 m	Caudal Nominal	1 m ³ /s
Recurso Hídrico	Río Cachi		
DATOS DE LA TURBINA			
Turbina G1			
Tipo de Turbina	Pelton	Potencia Nominal	4,68 MW
Caudal Nominal	1 m ³ /s	Marca	Por definir
Año de Fabricación	-		
DATOS DEL GENERADOR			
G1			
Potencia Nominal	5,0 MVA	Tensión de Generación	4,16 kV
Factor de Potencia	0,9	Marca	Por definir
Año de Fabricación	-		
DATOS DEL TRANSFORMADOR			
T1			
Potencia Nominal	5,5 MVA	Relación de Transformación	4,16/60 kV
Marca	Por definir	Año de Fabricación	-
DATOS DE CONTRATO		HITOS	
Tipo de Contrato	Concesión Definitiva de Generación con RER	Inicio de Obras POC	01.07.2019 (no) 10.07.2021
Número de Contrato	001-2015		
Firma de Contrato	27.01.2015		
Puesta en Operación Comercial	10.07.2021		

- INFORMACIÓN RELEVANTE**
- § Mediante Documento R.E.R. N° 0953-2014-GRA/PRES, se otorgó a favor de MPJ CONSULTING S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la C.H. Campanayoc.
 - § El 27.01.2015, se suscribió el Contrato de Concesión Definitiva N° 001-2015 entre la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho y MPJ CONSULTING S.A.C.
 - § Con R.D.R. N° 206-2017-GRA/GG-GRDE-DREM del 27.12.2017, se obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.
 - § La central cuenta con Estudio de Pre Operatividad aprobado; sin embargo, requiere ser actualizado por cambios en el punto de conexión y nivel de tensión el cual aún no está definido.
 - § Con carta N° 009-MPJ-2020, la Concesionaria remitió el Informe de Trimestral octubre - diciembre 2020, en la cual indican que debido a la pandemia mundial se suspendieron actividades de la obra, las cuales se reiniciarán a partir del mes de abril 2021. Asimismo, han solicitado una ampliación de plazo a la DREM.
 - § La Concesionaria del proyecto de la C.H. Campanayoc, solicitará al Gobierno Regional de Ayacucho la ampliación de plazo para la ejecución de las obras hasta octubre del 2022, la POC será para el 30.10.2022.
 - § La Concesionaria cuenta con Garantía de Fiel cumplimiento otorgado por el Banco Interbank con vigencia hasta el 09.11.2022.
 - § A la fecha, se viene realizando las licitaciones para las adquisiciones de los equipos y las gestiones para contratar a los Contratistas locales para construir la central y pago de servidumbres y compra de terrenos.
 - § Aún no inicia la etapa de ejecución de las obras civiles, estaba prevista para el 01.07.2019.

DIAGRAMA UNIFILAR

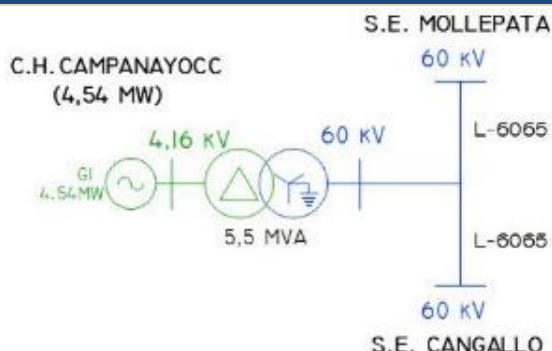

Ubicación



Área de ubicación de la Casa de Máquinas



Ubicación del recorrido de la tubería forzada



Ubicación de cámara de carga del proyecto
