
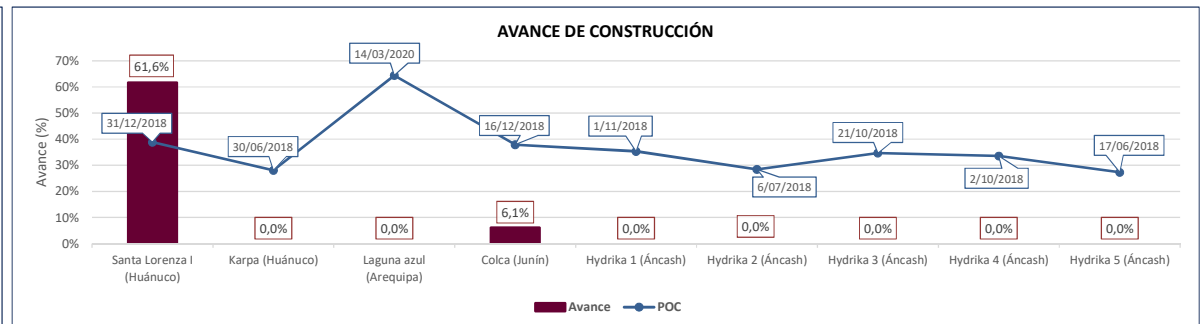


**CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES  
(Tercera Subasta)**

Ítem	Firma de Contrato	Tipo	Proyecto	Empresa Concesionaria	Energía Anual Adjudicada (MWh)	Potencia Instalada (MW)	Monto de Inversión (Mio US\$)	Precio Ofertado (Ctvs. US\$/kWh)	POC Contrato	POC Vigente	Avance	Estado (*)
1	18.02.2014	C.H.	Santa Lorenza I (Huánuco)	Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C.	140 000	18,70	41,7	6,48	31.12.2017	<b>31.12.2018</b>	61,6%	La Concesionaria solicitó la modificación del Cronograma de Ejecución de Obras y la ampliación de la POC hasta el 30.06.2023.; dicha solicitud está en revisión del MINEM. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. Las actividades en obra están paralizadas.
2	18.02.2014	C.H.	Karpa (Huánuco)	Hidroeléctrica Karpa S.A.C.	115 000	19,00	55,1	5,57	23.12.2016	<b>30.06.2018</b>	0,0%	El proyecto continúa paralizado, en arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima, a la espera de la audiencia pública, no informa avances en otras actividades ajenas al proceso de arbitraje. El principal factor de frenaje es el cierre financiero. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
3	18.02.2014	C.H.	Laguna azul (Arequipa)	CH Mamacocha S.R.L.	130 000	20,00	52,0	6,20	02.01.2017	<b>14.03.2020</b>	0,0%	Los arbitrajes que se siguen en la Cámara de Comercio de Lima y en el CIADI, continúan sin tener manifestaciones ni comentarios de parte de la Concesionaria C.H. Mamacocha. La POC estaba prevista para el 14.03.2020, la cual no se cumplió. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El proyecto está paralizado.
4	18.02.2014	C.H.	Colca (Junín)	Empresa de Generación Eléctrica Colca S.A.C.	70 196	12,05	22,4	5,69	18.11.2016	<b>16.12.2018</b>	6,1%	La Concesionaria inició el 14.12.2018, un proceso de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El proyecto se encuentra paralizado.
5	18.02.2014	C.H.	Hydrika 1 (Áncash)	Hydrika 1 S.A.C.	35 610	6,60	22,4	5,49	01.07.2018	<b>01.11.2018</b>	0,0%	Osinergmin el 29 de junio y el 15 de julio del presente año sostuvo reuniones remotas con el Estudio Arnold & Porter que viene defendiendo al Estado en el arbitraje que se lleva a cabo ante el CIADI. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado.
6	18.02.2014	C.H.	Hydrika 2 (Áncash)	Hydrika 2 S.A.C.	20 020	4,00	8,2	5,45	06.02.2018	<b>06.07.2018</b>	0,0%	Osinergmin el 29 de junio y el 15 de julio del presente año sostuvo reuniones remotas con el Estudio Arnold & Porter que viene defendiendo al Estado en el arbitraje que se lleva a cabo ante el CIADI. El MINEM solicitó al CIADI prórroga hasta el 19.08.2020 para responder, por el problema del COVID-19. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado.
7	18.02.2014	C.H.	Hydrika 3 (Áncash)	Hydrika 3 S.A.C.	50 810	10,00	30,6	5,39	21.06.2018	<b>21.10.2018</b>	0,0%	Osinergmin el 29 de junio y el 15 de julio del presente año sostuvo reuniones remotas con el Estudio Arnold & Porter que viene defendiendo al Estado en el arbitraje que se lleva a cabo ante el CIADI. El MINEM solicitó al CIADI prórroga hasta el 19.08.2020 para responder, por el problema del COVID-19. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado.
8	18.02.2014	C.H.	Hydrika 4 (Áncash)	Hydrika 4 S.A.C.	44 790	8,00	18,6	5,55	02.06.2018	<b>02.10.2018</b>	0,0%	Osinergmin el 29 de junio y el 15 de julio del presente año sostuvo reuniones remotas con el Estudio Arnold & Porter que viene defendiendo al Estado en el arbitraje que se lleva a cabo ante el CIADI. El MINEM solicitó al CIADI prórroga hasta el 19.08.2020 para responder, por el problema del COVID-19. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado.
9	18.02.2014	C.H.	Hydrika 5 (Áncash)	Hydrika 5 S.A.C.	57 930	10,00	21,9	5,39	17.01.2018	<b>17.06.2018</b>	0,0%	Osinergmin el 29 de junio y el 15 de julio del presente año sostuvo reuniones remotas con el Estudio Arnold & Porter que viene defendiendo al Estado en el arbitraje que se lleva a cabo ante el CIADI. El MINEM solicitó al CIADI prórroga hasta el 19.08.2020 para responder, por el problema del COVID-19. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El proyecto está en Arbitraje y continúa paralizado.
<b>TOTAL</b>					<b>664 356</b>	<b>108,35</b>	<b>272,920</b>					

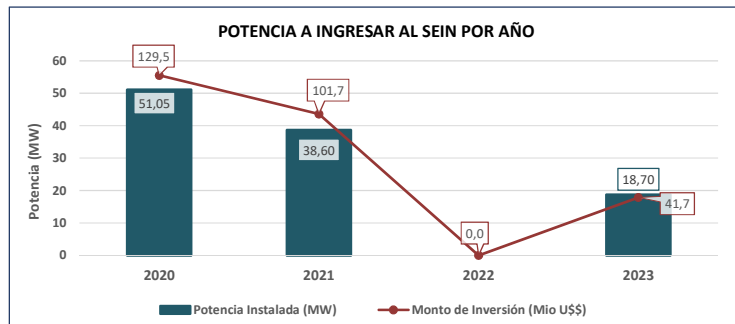

Donde:  
C.H. : Central Hidroeléctrica
